




DOCUMENTO OPERATIVO DEL RISCHIO SISMICO (DGR 1320 19/12/2016)

Monitoraggio delle azioni DOPS anno 2017 Sviluppo del DOPS 2018





Sviluppo del DOPS 2018


Monitoraggio dello stato di avanzamento degli edifici e attività finanziate

Il presente lavoro è il risultato del monitoraggio delle attività e degli interventi finanziati e previsti nel DOPS 2017. Per la descrizione dello stato di avanzamento è stata messa a punto una legenda che, per ogni attività, rappresenta in modo sintetico un livello di avanzamento procedurale distinto in 4 livelli. Sono stati considerati alcuni indicatori relativi al budget finanziario e alla fase di realizzazione delle attività.

Ciascuna fase procedurale fa riferimento a due aspetti strettamente connessi:


- **FINANZIARIO**: relativo agli impegni di spesa, all'erogazione delle somme in acconto o a parziale liquidazione, fino al saldo
- **REALIZZATIVO**: comprensivo della fase di progettazione, laddove prevista, e della esecuzione delle opere, indagini o verifiche, fino alla loro conclusione

Di seguito è riportato un quadro d'insieme delle diverse fasi di realizzazione: in colonna le fasi di progettazione ove prevista, esecuzione dei lavori o svolgimento attività e finanziamento, in riga i 4 livelli di avanzamento proposti.

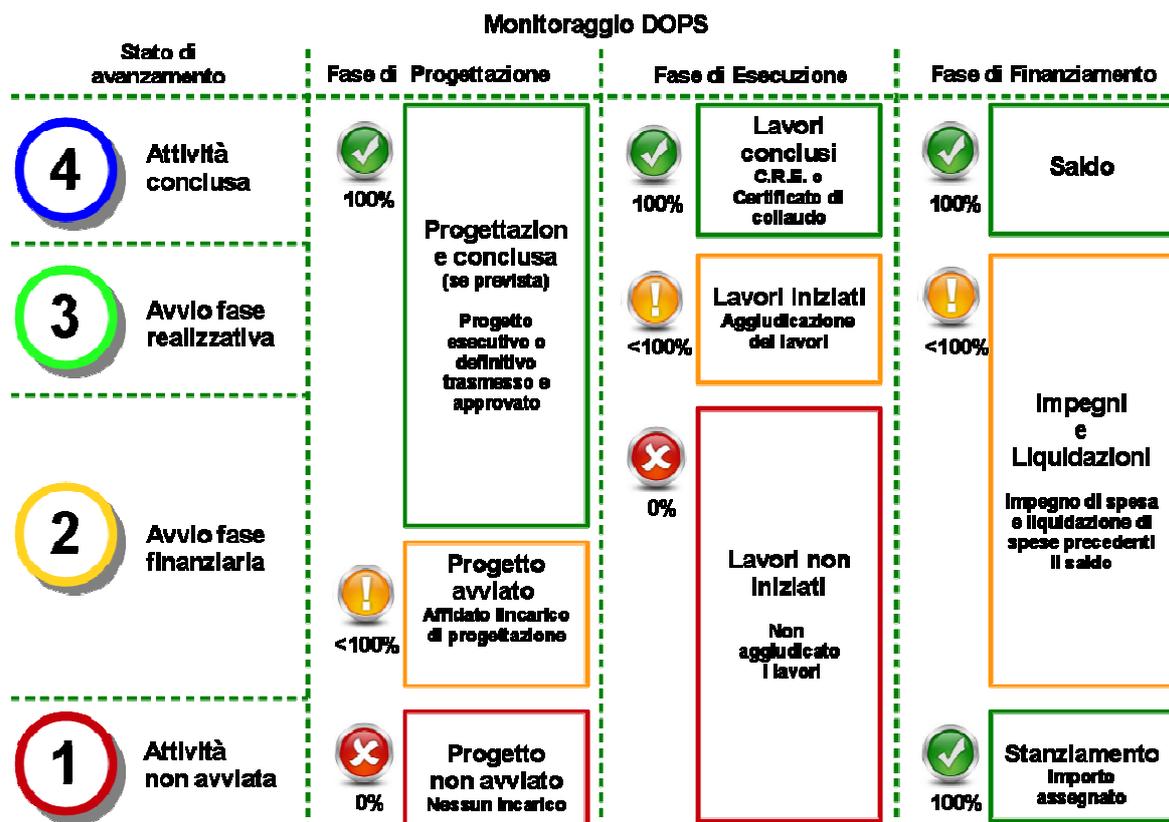

Quadro d'insieme delle fasi di realizzazione e finanziamento e livelli corrispondenti dello stato di avanzamento

Di seguito è riportato uno schema di sintesi delle fasi procedurali e dei 4 livelli associati.

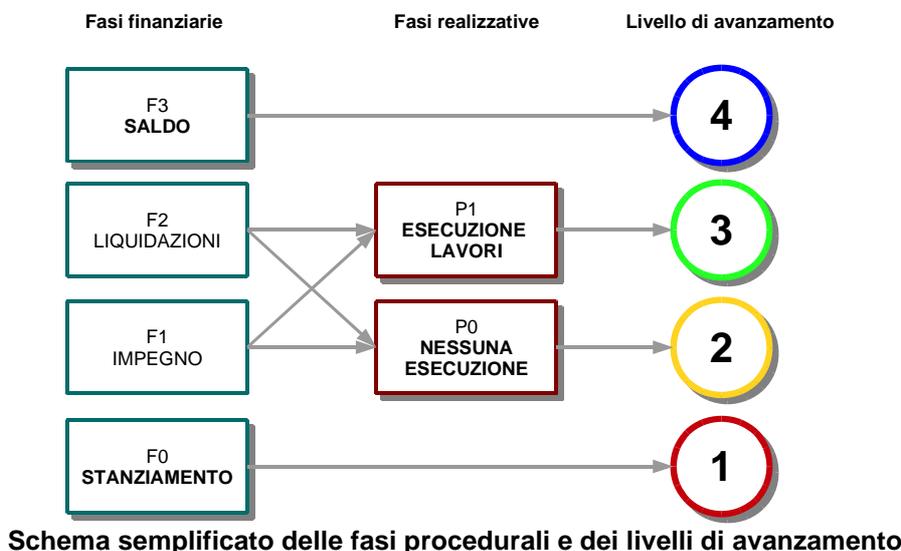

Schema semplificato delle fasi procedurali e dei livelli di avanzamento

Lo stato di avanzamento delle attività del DOPS 2017 è descritto secondo i seguenti 4 livelli di avanzamento procedurale:

- 1) **Livello 1 - Attività non avviata:** stanziamento risorse, atti amministrativi propedeutici al finanziamento, senza impegno di risorse (Livello 1)
- 2) **Livello 2 - Attività avviata sotto il profilo finanziario:** impegno delle risorse, anche con eventuale liquidazione di spese, indipendentemente dall'avvio della progettazione, ma senza realizzazione di opere (interventi, indagini/verifiche o studi di micro zonazione) (Livello 2)
- 3) **Livello 3 - Attività avviata sotto il profilo realizzativo:** successivamente all'impegno finanziario, sono avviate le attività per la realizzazione di interventi, opere, indagini o verifiche, microzonazione, ecc., eventuali liquidazioni di spesa in acconto o di rate non prevedono comunque il saldo finale, anche qualora i lavori siano conclusi
- 4) **Livello 4 - Attività conclusa:** erogazione del saldo finale a seguito della conclusione dei lavori

Per ciascuna attività è inoltre rappresentato il trend rispetto agli obiettivi del programma e al crono programma.

Di seguito è riportata la legenda sullo stato di avanzamento delle attività che è possibile utilizzare per la descrizione di ciascuna attività del DOPS.


stato di avanzamento	livello	descrizione
Attività conclusa	4	erogazione del saldo finale a seguito della progettazione (se prevista) e conclusione dei lavori o di indagini/verifiche
Avvio fase realizzativa	3	esecuzione lavori, indagini/verifiche con progettazione (se prevista), impegno di spesa ed eventuali liquidazioni di acconti o di rate ad esclusione del saldo
Avvio fase finanziaria	2	impegno di spesa, con o senza progettazione o esecuzione lavori, indagini/verifiche
Attività non avviata	1	stanziamento risorse senza alcun impegno di spesa, anche a fronte di attività propedeutica di progettazione o esecuzione lavori, indagini/verifiche

Legenda sullo stato di avanzamento delle attività del DOPS 2018



1. Quadro generale dei programmi finanziari

Nel primo capitolo è descritto lo stato di avanzamento delle attività inserite nel DOPS 2017, utilizzando la legenda per 4 livelli di avanzamento procedurale. In mappa sono riportati gli stanziamenti complessivi per ciascun comune e in tabella il quadro riepilogativo per ogni singola attività, con l'indicatore di livello e di trend degli ultimi 12 mesi.

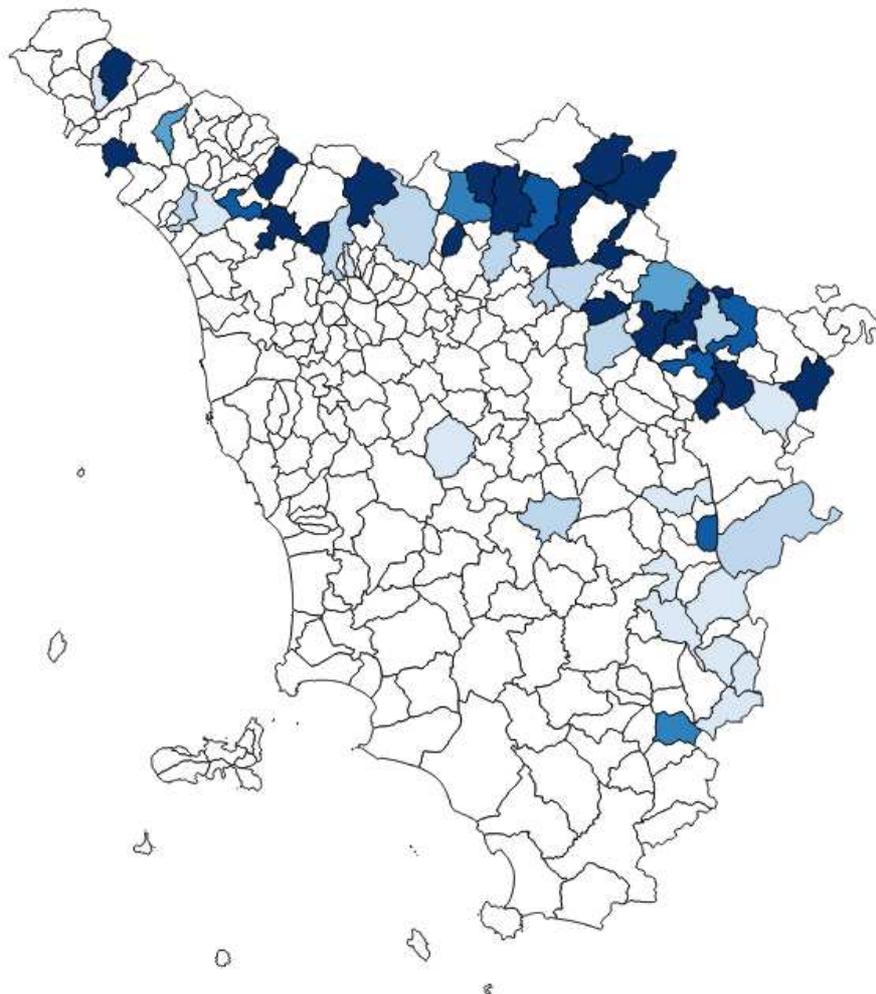

-  Comuni inseriti nel DOPS 2017 con stanziamento complessivo superiore a € 500.000,00
-  Comuni inseriti nel DOPS 2017 con stanziamento complessivo compreso tra a € 250.000,00 e
-  Comuni inseriti nel DOPS 2017 con stanziamento complessivo inferiore a € 250.000,00
-  Comuni non inseriti nel DOPS 2017



Titolo	Fonte finanziaria	Finalità	Atti programmatici	Importo assegnato Euro	Importo impegnato Euro	%	Numero comuni	Numero interventi	Stato di attuazione (medio)	trend
Interventi su scuole	L. 289/2009 e L. 107/2015	Interventi scuole	Del. GRT 98/2004, 530/2006 e 997/2007	4.640.960,36	4.640.960,36	100%	9	15	2	↑
Interventi "Cutigliano"	DL269/2003 art. 32bis DPCM 8/07/2014	Interventi scuole	DD 1217/2015 DD 13490 13/9/2017	415.631,98	415.631,98	100%	1	1	3	↑
Microzonazione sismica	OCDCP 171/2014 DGRT 144/2015	Microzonazione sismica	DD 13460 14/11/2016 DD 9973 3/7/2017	658.532,00	609.283,00	93%	40	40	3	↑
Interventi su edifici pubblici (EPSR)	L. 77/2009 art. 11 DGRT 902/2016	Interventi EPSR	DD 13747 18/11/2016 DD 13468/2017	15.574.598,84	5.530.590,21	36%	25	27	2	→
Interventi su edifici privati	L. 77/2009 art. 11 OCDCP 52/2013 e 171/2014 DCR RT 1321/2016 DCR RT 446/2017	Interventi privati	DD 13636/2017	8.904.952,08	1.029.616,00	12%	65	326	1	↑
Verifiche sismiche	L.R. 58/2009	Verifiche sismiche		232.396,65	232.396,65	100%	19	21	3	↑
Totale				30.427.071,91	12.458.478,20	41%	159	430		



**Tabella generale riepilogativa delle attività inserite nel programma DOPS 2017
Stato di avanzamento a febbraio 2018**

stato di avanzamento	livello	descrizione
Attività conclusa	4	erogazione del saldo finale a seguito della progettazione (se prevista) e conclusione dei lavori o di indagini/verifiche
Avvio fase realizzativa	3	esecuzione lavori, indagini/verifiche con progettazione (se prevista), impegno di spesa ed eventuali liquidazioni di acconti o di rate ad esclusione del saldo
Avvio fase finanziaria	2	impegno di spesa, con o senza progettazione o esecuzione lavori, indagini/verifiche
Attività non avviata	1	stanziamento risorse senza alcun impegno di spesa, anche a fronte di attività propedeutica di progettazione o esecuzione lavori, indagini/verifiche

Legenda dello stato di avanzamento del DOPS

Provincia	N. comuni	N. interventi	Importo assegnati	Importo impegnato	%
AR	25	141	10.034.619,42	2.471.246,62	25%
FI	17	56	8.161.677,65	6.214.189,65	76%
GR	2	2	21.294,75	21.294,75	100%
LU	21	85	3.922.558,30	2.360.108,30	60%
MS	16	107	3.891.862,00	688.700,00	18%
PI	2	2	21.006,90	21.006,90	100%
PO	3	8	2.753.457,09	7.600,00	0%
PT	9	14	1.220.981,98	490.881,98	40%
SI	13	15	320.683,74	183.450,00	57%
Totale	108	430	30.427.071,91	12.458.478,20	41%

Ripartizione dei finanziamenti per provincia

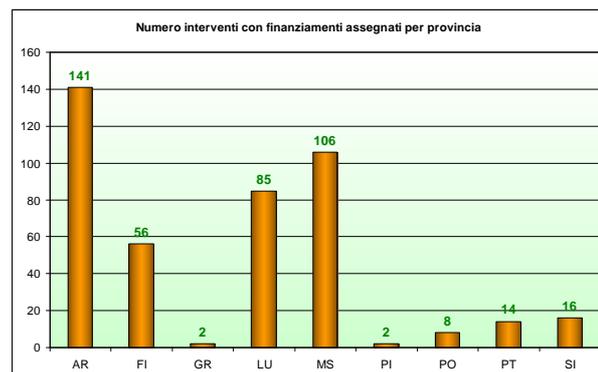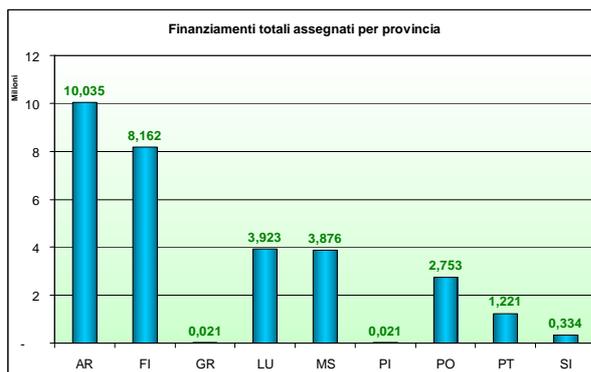




2. Dettaglio per ciascun programma finanziario


Nel capitolo 2 è descritto lo stato di avanzamento in forma sintetica di ciascuna attività inserita nel DOPS 2017. Una mappa rappresenta i comuni oggetto dei rispettivi finanziamenti, mentre una tabella seguita dai grafici, mostra i dati aggregati per provincia.

a) L. 289/2009 – Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici

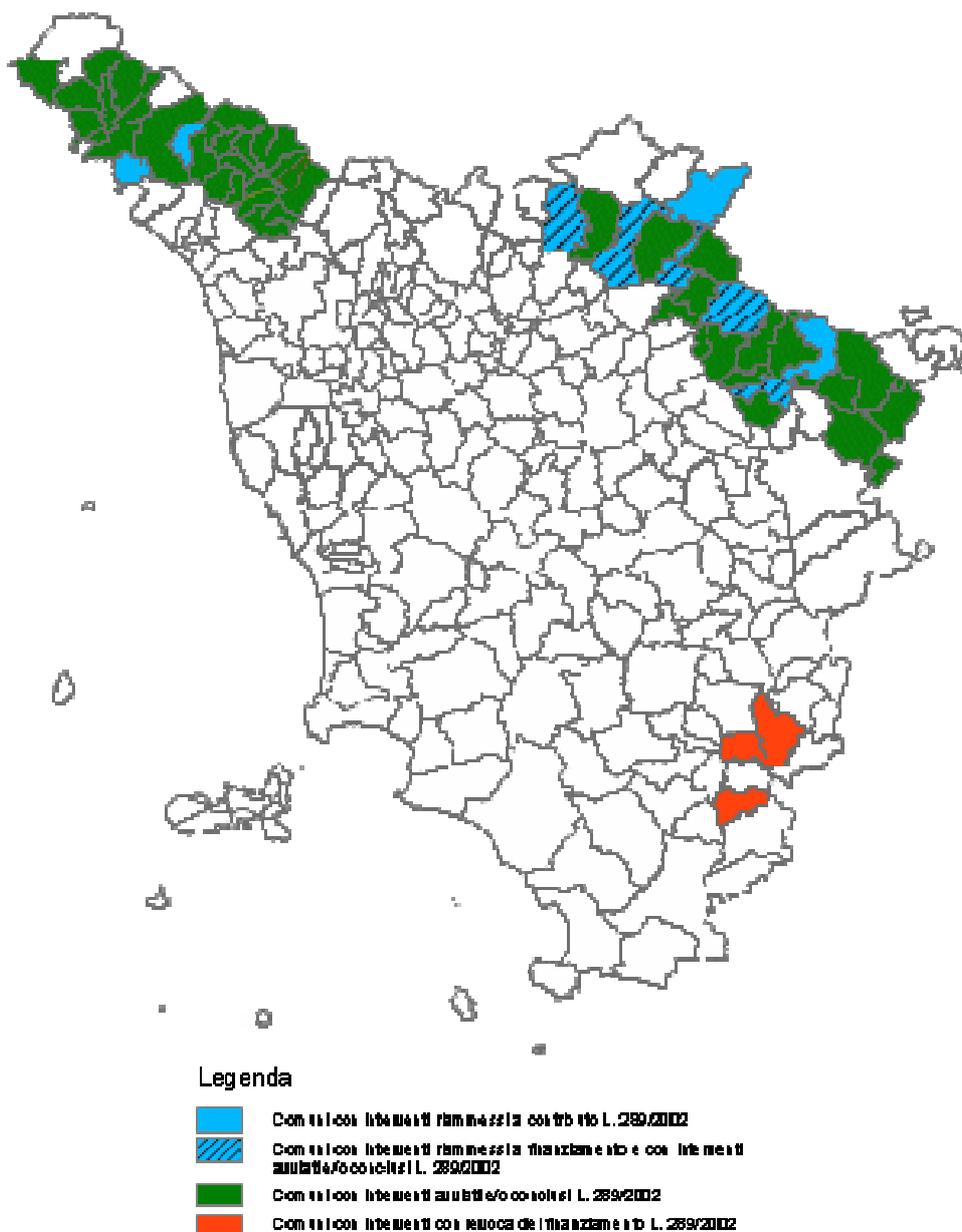




Provincia	N. comuni	N. interventi	Importo assegnato	Importo impegnato	%	Stato di attuazione
AR	3	4	670.394,48	670.394,48	100%	2
FI	4	9	3.520.565,88	3.520.565,88	100%	2
MS	2	2	450.000,00	450.000,00	100%	2
Totale	9	15	4.640.960,36	4.640.960,36	100%	2

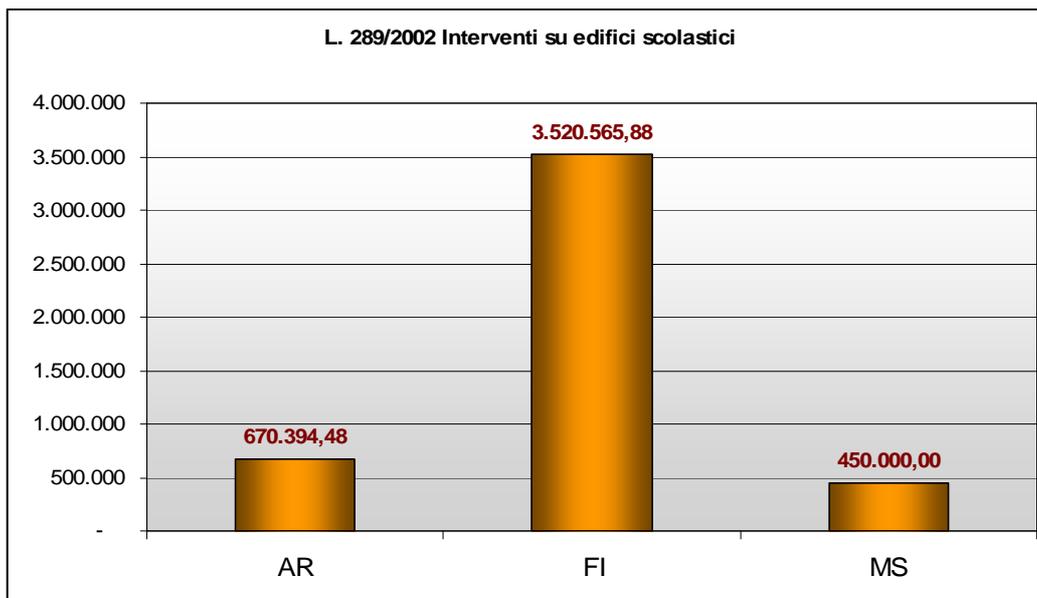


livello	stato di avanzamento	N. comuni	N. interventi	Importo assegnato	Importo impegnato
4	Attività conclusa	0	0	-	-
3	Avvio fase realizzativa	2	2	266.397,93	266.397,93
2	Avvio fase finanziaria	7	13	4.374.562,43	4.374.562,43
1	Attività non avviata	0	0	-	-
	totale	9	15	4.640.960,36	4.640.960,36

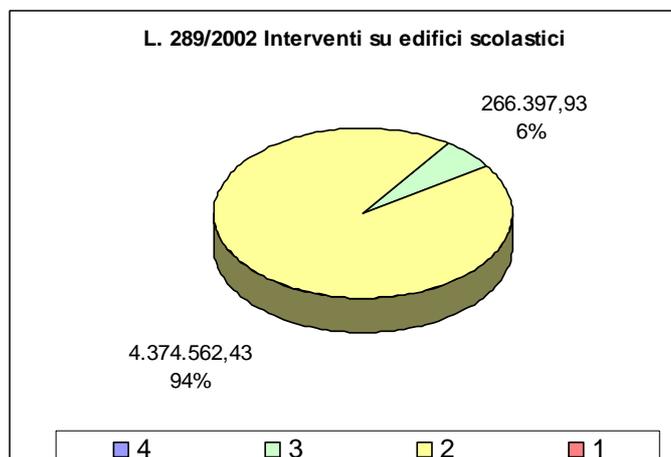


**b) Altre leggi con residui di interventi non ancora completati**

Provincia	N. comuni	N. interventi	Importo assegnati	Importo impegnato	%	Stato di attuazione
PT	1	1	415.631,98	415.631,98	100%	3
Totale	1	1	415.631,98	415.631,98	100%	3

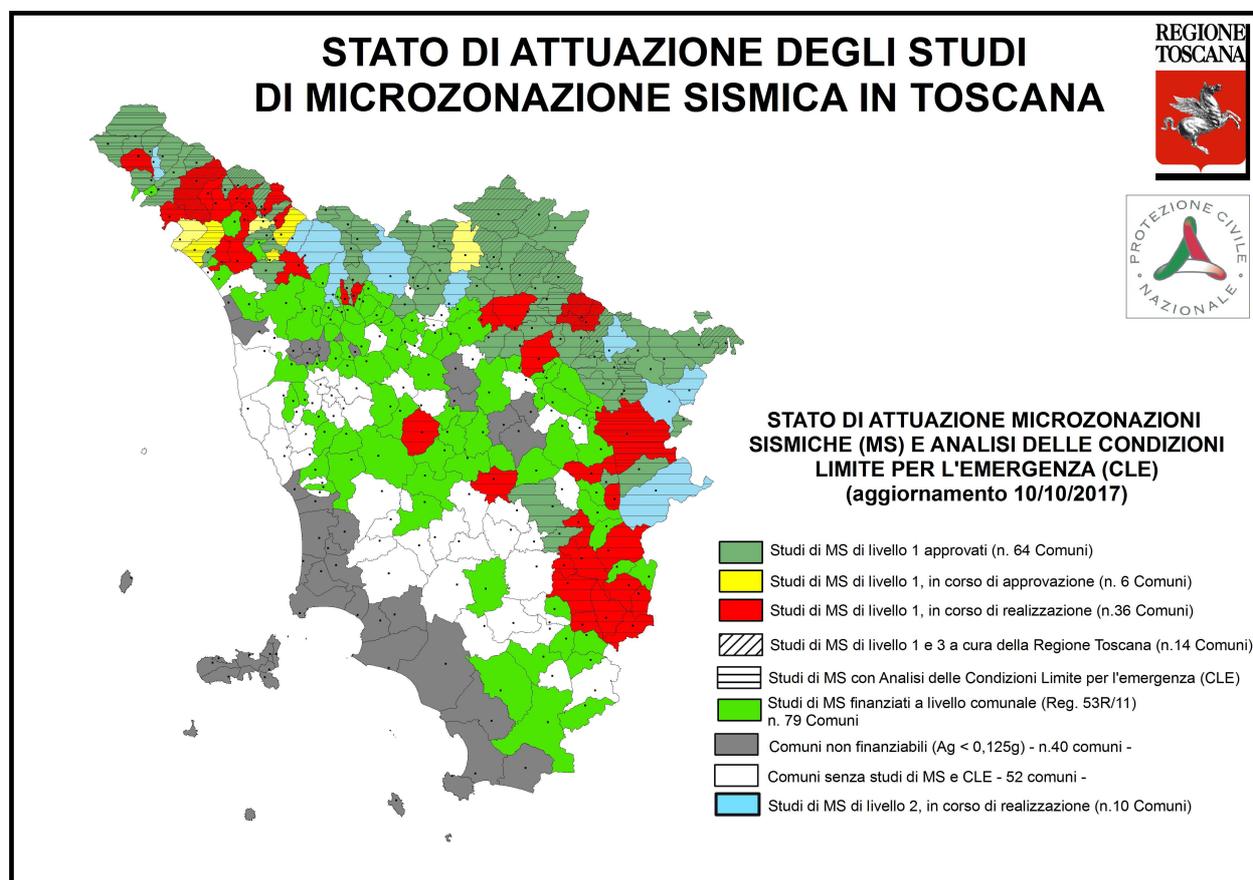c) L. 77/2009 art. 11 - OPCM 2012/2016 e Fondi regionali L.R. 58/2009**c.1) Microzonazione sismica**




Provincia	N. comuni	N. interventi	Importo assegnato	Importo impegnato	%	Stato di attuazione (medio)
AR	7	7	115.500,00	115.500,00	100%	3
FI	4	4	81.000,00	81.000,00	100%	3
LU	12	12	143.833,00	143.833,00	100%	3
MS	2	2	20.250,00	20.250,00	100%	3
PT	3	3	65.250,00	37.500,00	57%	2
SI	12	12	183.450,00	183.450,00	100%	2
Totale	40	40	658.532,00	581.533,00	100%	2

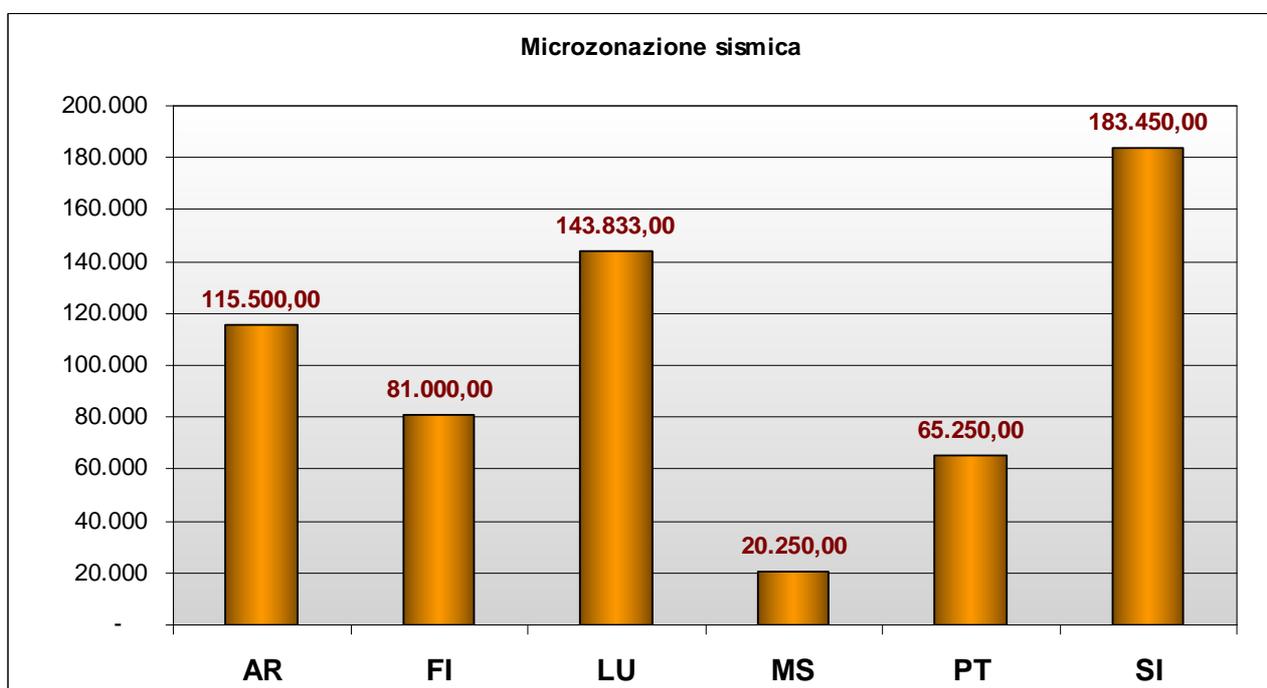

livello	stato di avanzamento	N. comuni	N. interventi	Importo assegnato	Importo impegnato
4	Attività conclusa	0	0	-	-
3	Avvio fase realizzativa	39	39	581.533,00	581.533,00
2	Avvio fase finanziaria	0	0	-	-
1	Attività non avviata	0	0	-	-
	totale	39	39	581.533,00	581.533,00

**c.2) Interventi su Edifici pubblici strategici e rilevanti (EPSR)****c.2.1) Quadro complessivo – Edifici scolastici e non scolastici**

Provincia	N. comuni	N. interventi	Importo assegnato	Importo impegnato	%	Stato di attuazione (medio)
AR	7	8	5.190.856,94	1.040.798,14	20%	1
FI	7	7	3.534.963,77	2.482.816,77	70%	2
LU	4	5	2.577.725,30	2.006.975,30	78%	2
MS	2	2	905.462,00	-	0%	1
PO	3	3	2.683.557,09	-	0%	1
PT	1	1	562.700,00	-	0%	1
SI	1	1	119.333,74	-	0%	1
Totale	25	27	15.574.598,84	5.530.590,21	36%	1

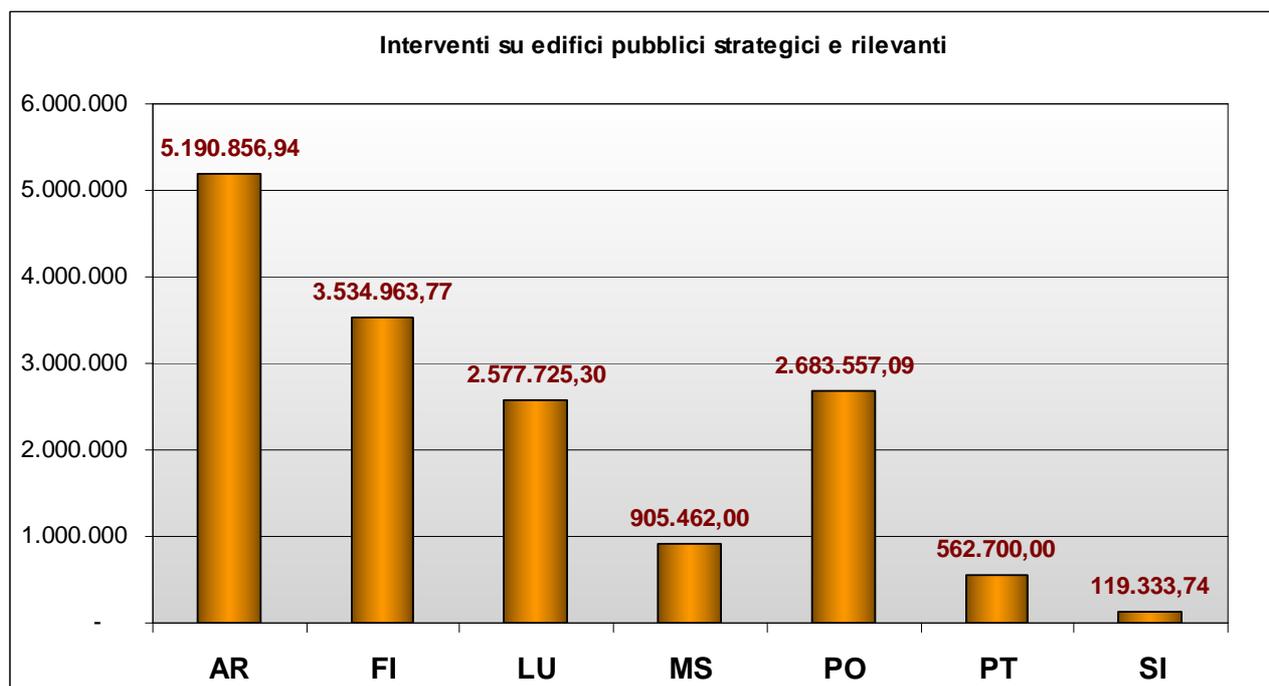


livello	stato di avanzamento	N. comuni	N. interventi	Importo assegnato	Importo impegnato
4	Attività conclusa	0	0	-	-
3	Avvio fase realizzativa	10	10	5.239.205,21	5.239.205,21
2	Avvio fase finanziaria	1	1	291.385,00	291.385,00
1	Attività non avviata	16	16	10.044.008,63	-
	totale	27	27	15.574.598,84	5.530.590,21

**c.3) Interventi su Edifici Privati**

Provincia	N. comuni	N. interventi	Importo assegnato	Importo impegnato	%	Stato di attuazione (medio)
AR	16	115	3.998.882,00	585.568,00	15%	1
FI	9	30	946.089,00	50.748,00	5%	1
LU	17	67	1.185.000,00	193.300,00	16%	1
MS	14	98	2.480.100,00	182.400,00	7%	1
PO	3	5	69.900,00	7.600,00	11%	1
PT	5	9	177.400,00	10.000,00	6%	1
SI	1	2	17.900,00	-	0%	1
Totale	65	326	8.904.952,08	1.029.616,00	12%	1


L'importo di cui al presente par. c.3 sarà da impegnare a seguito dell'approvazione del DOPS 2018.

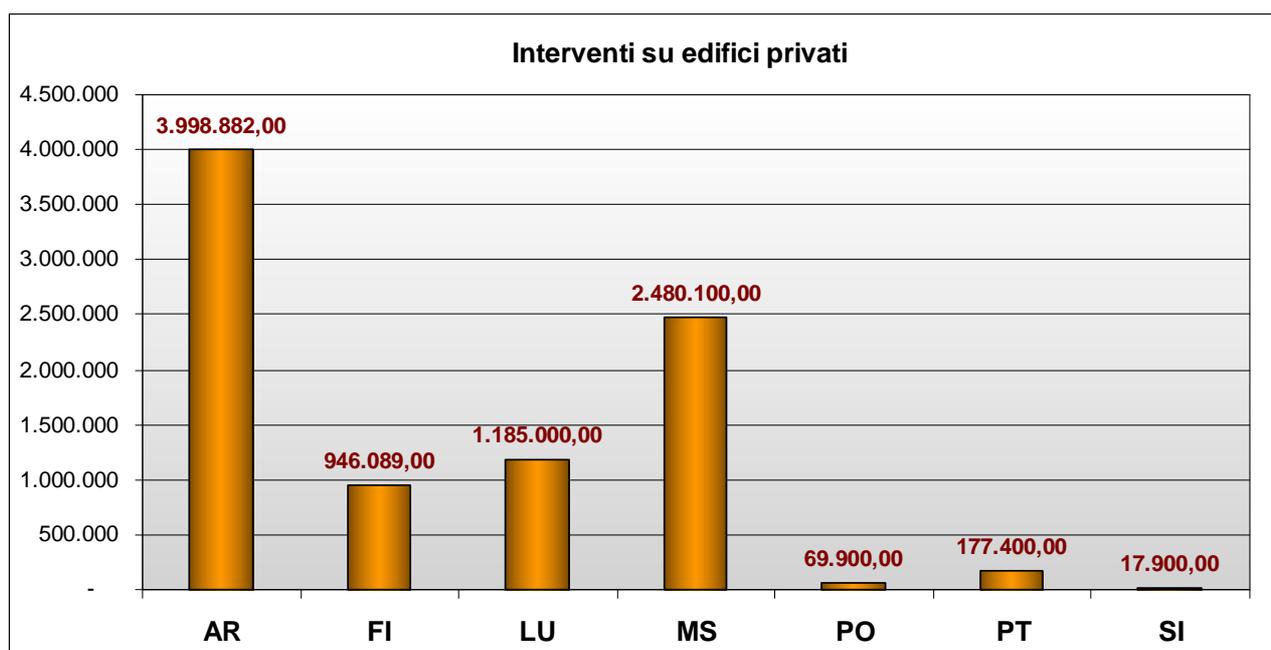

livello	stato di avanzamento	N. comuni	N. interventi	Importo assegnato	Importo impegnato
4	Attività conclusa	0	0	-	-
3	Avvio fase realizzativa	0	0	-	-
2	Avvio fase finanziaria	6	8	135.516,00	-
1	Attività non avviata	59	318	8.739.755,00	-
	totale	65	326	8.875.271,00	-

**c.4) Verifiche su Edifici Pubblici Strategici e Rilevanti**

Provincia	N. comuni	N. interventi	Importo assegnato	Importo impegnato	%	Stato di attuazione (medio)
AR	7	7	58.986,00	58.986,00	100%	3
FI	4	6	79.059,00	79.059,00	100%	3
GR	2	2	21.294,75	21.294,75	100%	3
LU	1	1	16.000,00	16.000,00	100%	3
MS	3	3	36.050,00	36.050,00	100%	2
PI	2	2	21.006,90	21.006,90	100%	3
Totale	19	21	232.396,65	232.396,65	100%	3

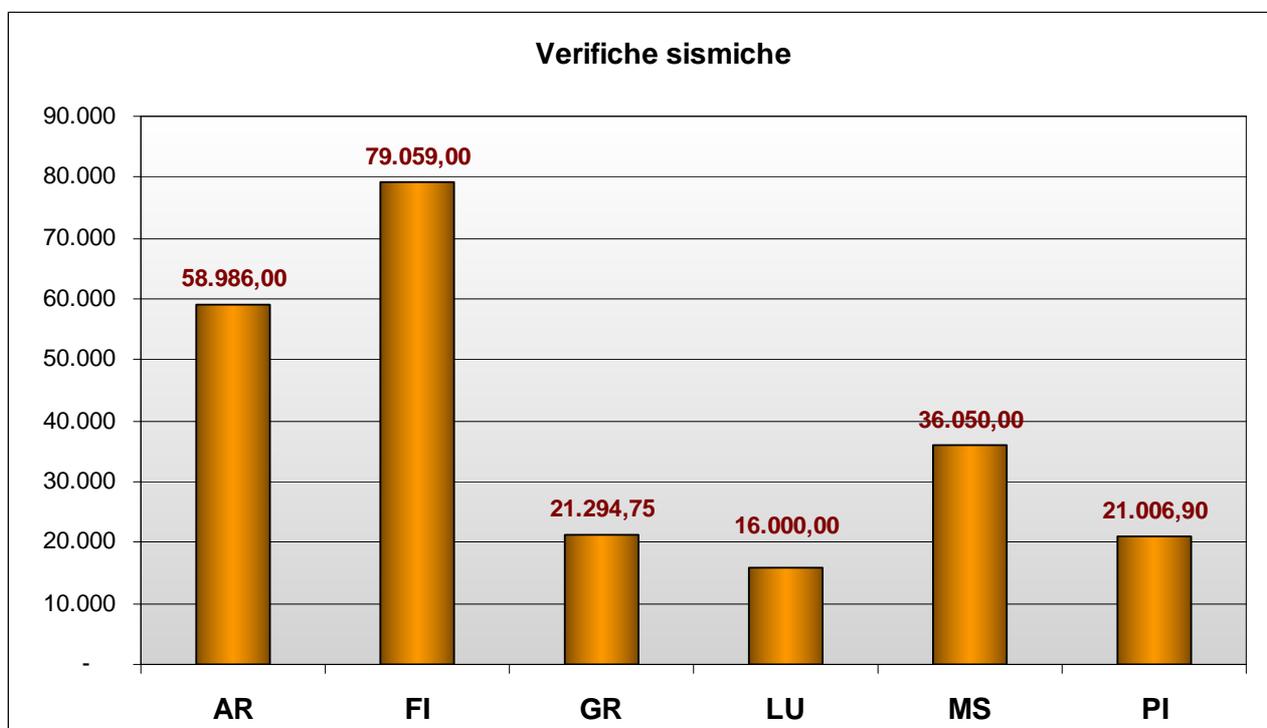

livello	stato di avanzamento	N. comuni	N. interventi	Importo assegnato	Importo impegnato
4	Attività conclusa	4	4	51.967,00	51.967,00
3	Avvio fase realizzativa	15	17	180.429,65	180.429,65
2	Avvio fase finanziaria	0	0	-	-
1	Attività non avviata	0	0	-	-
	totale	19	21	232.396,65	232.396,65



Regione Toscana

Settore Sismica
Prevenzione sismica



ALLEGATO 1

Dettaglio per ciascun finanziamento



Dettaglio per ciascuna legge di finanziamento

In allegato è descritto lo stato di avanzamento anche finanziario in forma analitica per ogni singolo intervento, gli importi assegnati e liquidati, con una descrizione sintetica del trend di avanzamento rispetto agli obiettivi e al cronoprogramma.

a) L. 289/2009 – Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici

N.	ID	Fonte finanziamento	Prov.	Ente beneficiario	Comune	Denominazione intervento	Tipo intervento	Importo assegnato	Importo impegnato	Avvio lavori/attività	Importo liquidato (acconto)	Importo liquidato (saldo)	SdA feb2018	1	2	3	4	trend	
1	289_1	289	AR	Comune	Castel Focognano	Scuola Elementare	N	176.397,93	176.397,93	si	176.397,93		3						↑
2	289_2	289	AR	Comune	Chiusi della Verna	Scuola Elementare Materna e Media	N	293.996,55	293.996,55		293.996,55		2						↑
3	289_3	289	AR	Comune	Chiusi della Verna	Scuola elementare + Sc. Materna e Media	N	100.000,00	100.000,00		100.000,00		2						↑
4	289_4	289	AR	Comune	Pratovecchio e Stia	Scuola materna "L. Ghelli"	A	100.000,00	100.000,00		100.000,00		2						↑
5	289_5	289	FI	Comune	Barberino di Mugello	Scuola Elementare "Lorenzo il Magnifico"	N	195.997,70	195.997,70		195.997,70		2						↑
6	289_6	289	FI	Comune	Barberino di Mugello	Scuola elementare e Palestra "Il Magnifico"	N	200.000,00	200.000,00		200.000,00		2						↑
7	289_7	289	FI	Comune	Borgo San Lorenzo	Scuola Elementare "Dante Alighieri"	M	215.597,47	215.597,47		215.597,47		2						↑
8	289_8	289	FI	Comune	Borgo San Lorenzo	Scuola Elementare e Materna "Don Minzoni"	N	244.997,13	244.997,13		0,00		2						→
9	289_9	289	FI	Comune	Borgo San Lorenzo	Scuola elementare "Dante Alighieri"	M	100.000,00	100.000,00		100.000,00		2						↑
10	289_10	289	FI	Comune	Borgo San Lorenzo	Scuola elementare "Don Minzoni"	N	200.000,00	200.000,00		0,00		2						→
11	289_11	289	FI	Comune	Dicomano	Scuola Mat. Elem. Media e Palestra "D. da Settignano"	A	1.959.977,03	1.959.977,03		1.959.977,03		2						↑
12	289_12	289	FI	Comune	Marradi	Scuola Media Elementare "Dino Campana"	MN	293.996,55	293.996,55		293.996,55		2						↑
13	289_13	289	FI	Comune	Marradi	Scuola media ed elementare "Dino Campana"	MN	110.000,00	110.000,00		110.000,00		2						↑
14	289_14	289	MS	Comune	Casola in Lunigiana	Scuola materna	A	90.000,00	90.000,00	si	90.000,00		3						↑
15	289_15	289	MS	Comune	Fosdinovo	Scuola elementare e media	N	360.000,00	360.000,00		360.000,00		2						↑
TOTALE REGIONE TOSCANA								4.640.960,36	4.640.960,36		4.195.963,23	0,00							

b) Altre leggi con residui di interventi non ancora completati

N.	ID	Fonte finanziamento	Prov.	Ente beneficiario	Comune	Denominazione edificio	Tipo intervento	Importo assegnato	Importo impegnato	Avvio lavori/attività	Importo liquidato (acconto)	Importo liquidato (saldo)	SdA feb2018	1	2	3	4	trend	
1	244_CUT_1	244_CUT	PT	Comune	Cutigliano	Adeguamento sismico e strutturale scuola elementare, media e palestra "Alcide De Gasperi"	A	436.900,00	415.631,98	si	300.000,00		3						↑



c) L. 77/2009 art. 11 - OPCM 2012/2016 e Fondi regionali L.R. 58/2009

c.1) Microzonazione sismica

N.	ID	Fonte finanziamenti	Prov.	Ente beneficiario	Comune	Denominazione edificio	Tipo intervento	Importo assegnato	Importo impegnato	Avvio lavori/attività	Importo liquidato (accanto)	Importo liquidato (saldo)	SdA nov2017	1	2	3	4	trend	
1	MS_1	MS	AR	Comune	Sestino		CLE	3 000.00	3 000.00	si	2 100.00		3						↑
2	MS_2	MS	AR	Comune	Sansepolcro		MS2	20 250.00	20 250.00	si	14 175.00		3						↑
3	MS_3	MS	AR	Comune	Anghiari		MS2	17 250.00	17 250.00	si	12 075.00		3						↑
4	MS_4	MS	AR	Comune	Bibbiena		MS2	20 250.00	20 250.00	si	14 175.00		3						↑
5	MS_5	MS	LU	U.C. Media Valle del Serchio	Barga		MS2	7 083.25	7 083.25	si	4958,27		3						↑
6	MS_6	MS	LU	U.C. Media Valle del Serchio	Pescaglia		MS2	7 083.25	7 083.25	si	4958,27		3						↑
7	MS_7	MS	LU	U.C. Media Valle del Serchio	Coreglia		MS2	7 083.25	7 083.25	si	4958,27		3						↑
8	MS_8	MS	LU	U.C. Media Valle del Serchio	Bagni di Lucca		MS2	7 083.25	7 083.25	si	4958,27		3						↑
9	MS_9	MS	MS	Comune	Villafranca in Lunigiana		MS2	14 250.00	14 250.00	si	9900,36		3						↑
10	MS_10	MS	PT	Comune	Pistoia		MS2	27 750.00		REVUCA FINANZIAMENTO			0						↓
11	MS_11	MS	AR	Comune	Cortona		MS2	20 250.00	20 250.00	si	14 175.00		3						↑
12	MS_12	MS	PT	Comune	Pescia		MS2	20 250.00	20 250.00	si	14 175.00		3						↑
13	MS_13	MS	FI	Comune	Calenzano		MS2	20 250.00	20 250.00	si	14 175.00		3						↑
14	MS_14	MS	MS	Comune	Casola in Lunigiana		MS1	6 000.00	6 000.00	si	4 200.00		3						↑
15	MS_15	MS	FI	Comune	Pontassieve		MS1	20 250.00	20 250.00	si	14 175.00		3						↑
16	MS_16	MS	LU	Comune	Stazzema		MS1	14 250.00	14 250.00	si	9 975.00		3						↑
17	MS_17	MS	FI	Comune	Fiesole		MS1	20 250.00	20 250.00	si	14 175.00		3						↑
18	MS_18	MS	LU	Comune	Seravezza		MS1	20 250.00	20 250.00	si	14 175.00		3						↑
19	MS_19	MS	AR	Comune	Foiano della Chiana		MS1	17 250.00	17 250.00	si	12 075.00		3						↑
20	MS_20	MS	PT	Comune	Buggiano		MS1	17 250.00	17 250.00	si	10 500.00		3						↑
21	MS_21	MS	SI	Comune	Cetona		MS1	14 250.00	14 250.00	si	9 975.00		3						↑
22	MS_22	MS	SI	Comune	Sarteano		MS1	14 250.00	14 250.00	si	9 975.00		3						↑
23	MS_23	MS	SI	Comune	Pienza		MS1	11 250.00	11 250.00	si	7837,20		3						↑
24	MS_24	MS	SI	Comune	Trequanda		MS1	11 250.00	11 250.00	si	3 522.75		3						↑
25	MS_25	MS	SI	U.C. Amiata Val d'Orcia	Abbadia San Salvatore		MS1	15 300.00	15 300.00	si	10 710.00		3						→
26	MS_26	MS	SI	U.C. Amiata Val d'Orcia	San Quirico d'Orcia		MS1	15 300.00	15 300.00	si	10 710.00		3						→
27	MS_27	MS	SI	U.C. Amiata Val d'Orcia	Castiglione d'Orcia		MS1	15 300.00	15 300.00	si	10 710.00		3						→
28	MS_28	MS	SI	U.C. Amiata Val d'Orcia	Radicofani		MS1	15 300.00	15 300.00	si	10 710.00		3						→
29	MS_29	MS	SI	Comune	Siena		MS1	27 750.00	27 750.00	si	19 271.70		3						↑
30	MS_30	MS	SI	Comune	San Gimignano		MS1	17 250.00	17 250.00	si	6718,85		3						↑
31	MS_31	MS	LU	U.C. Garfagnana	San Romano		MS1	12 750.00	12 750.00	si	8 925.00		3						↑
32	MS_32	MS	LU	U.C. Garfagnana	Minucciano		MS1	12 750.00	12 750.00	si	8 925.00		3						↑
33	MS_33	MS	LU	U.C. Garfagnana	Camporgiano		MS1	12 750.00	12 750.00	si	8 925.00		3						↑
34	MS_34	MS	LU	U.C. Garfagnana	Careggine		MS1	12 750.00	12 750.00	si	8 925.00		3						↑
35	MS_35	MS	LU	U.C. Garfagnana	Piazza al Serchio		MS1	12 750.00	12 750.00	si	8 925.00		3						↑
36	MS_36	MS	LU	Comune	Borgo a Mozzano		MS1	17 250.00	17 250.00	si	12 075.00		3						↑
37	MS_37	MS	FI	Comune	Reggello		MS1	20 250.00	20 250.00	si	14 175.00		3						↑
38	MS_38	MS	AR	Comune	Monte San Savino		MS1	17 250.00	17 250.00	si	12 075.00		3						↑
39	MS_39	MS	SI	Comune	Montepulciano		MS1	15 000.00	15 000.00	si	10 500.00		3						↑
40	MS_40	MS	SI	Comune	San Casciano Bagni		MS1	11 250.00	11 250.00	si	7 875.00		3						↑



c.2) Interventi su Edifici pubblici strategici e rilevanti (EPSR)

c.2.1) Quadro complessivo – Edifici scolastici e non scolastici

N.	ID	Fonte finanziamento	Prov.	Ente beneficiario	Comune	Denominazione edificio	Tipo intervento	Importo assegnato	Importo impegnato	Avvio lavori/attività	Importo liquidato (accanto)	Importo liquidato (saldo)	SdA feb2018	1	2	3	4	trend
1	PUB_1	PUB	FI	Comune di Marradi	Marradi	Palestra e spogliatoio dell'IC "Dino Campana"	A	404 140.89	404 140.89	si	20 207.04		3					↑
2	PUB_2	PUB	LU	Comune di Barga	Barga	Scuola elementare "Giovanni Pascoli", sede COC	A	645 000.00	645 000.00	si	32 250.00		3					↑
3	PUB_3	PUB	LU	Provincia di Lucca	Barga	Edificio "A. Mordini"	A	260 000.00	260 000.00	si			3					↑
4	PUB_4	PUB	FI	Comune di Pelago	Pelago	Scuola primaria G. De Majo	A	795 000.00	795 000.00	si	39 750.00		3					↑
5	PUB_5	PUB	LU	Comune di Borgo a Mozzano	Borgo a Mozzano	Scuola elementare del capoluogo	A	792 610.80	792 610.80	si	39 630.54		3					↑
6	PUB_6	PUB	FI	Comune di Scarperia e San Piero	Scarperia e San Piero	Scuola secondaria Scarperia	A	452 700.00	452 700.00	si	22 635.00		3					↑
7	PUB_7	PUB	FI	Comune di Dicomano	Dicomano	Palestra ed annessi della Scuola media "Desiderio da Settignano"	M	291 385.00	291 385.00				2					↑
8	PUB_8	PUB	FI	Comune di Barberino di Mugello	Barberino di Mugello	Palestra comunale (Scuola primaria "G. Mazzini")	A	172 550.00					1					→
9	PUB_9	PUB	PO	Comune di Vernio	Vernio	Istituto comprensivo Sandro Pertini	A	1 478 850.00					1					→
10	PUB_10	PUB	AR	Comune di Capolona	Capolona	Scuola elementare "Tortelli" - Plesso B (palestra e annessi)	A	574 011.00					1					→
11	PUB_11	PUB	AR	Comune di Foiano della Chiana	Foiano della Chiana	Palestra scuola Fra Benedetto Tiezzi loc. Pozzo della Piana	A	282 770.20					1					→
12	PUB_12	PUB	AR	Comune di Sansepolcro	Sansepolcro	Scuola media Buonarroti	A	1 670 907.60					1					→
13	PUB_13	PUB	FI	Comune di Borgo San Lorenzo	Borgo San Lorenzo	Scuola media "Giovanni della Casa"	A	879 597.00					1					→
14	PUB_14	PUB	LU	Comune di Fabbriche di Vergemoli	Fabbriche di Vergemoli	Edificio municipale loc. Campaccio Fabbriche di Vallico	A	309 364.50	309 364.50	si	15 468.23		3					↑
15	PUB_15	PUB	AR	Unione Comuni montani Casentino	Poppi	Sede Unione dei Comuni montani del Casentino loc. Ponte a Poppi	MA	720 798.14	720 798.14	si	36 039.91		3					↑
16	PUB_16	PUB	AR	Comune di Castel Focognano	Castel Focognano	Palazzo municipale - sede COC loc. Rassina	M	320 000.00	320 000.00	si	16 000.00		3					↑
17	PUB_17	PUB	FI	Comune di Palazzuolo sul Senio	Palazzuolo sul Senio	Palazzo comunale	A	539 590.88	539 590.88	si	26 799.54		3					↑
18	PUB_18	PUB	PO	Comune di Montemurlo	Montemurlo	Uffici comunali di via Toscanini	A	985 800.00					1					→
19	PUB_19	PUB	LU	Comune di Villa Basilica	Villa Basilica	Palazzo comunale	M	570 750.00					1					→
20	PUB_20	PUB	AR	Comune di Castel San Niccolò	Castel San Niccolò	Palazzo comunale loc. Strada in Casentino	M	518 620.00					1					→
21	PUB_21	PUB	AR	Comune di Subbiano	Subbiano	Sede del Comune	M	540 000.00					1					→
22	PUB_22	PUB	SI	Comune di Piancastagnaio	Piancastagnaio	Caserma carabinieri	M	119 333.74					1					→
23	PUB_23	PUB	PT	Comune di San Marcello Piteglio	San Marcello Piteglio	Palestra comunale Piteglio	A	562 700.00					1					→
24	PUB_24	PUB	MS	Comune di Bagnone	Bagnone	Edificio Caserma Carabinieri	M	580 320.00					1					→
25	PUB_25	PUB	AR	Comune di Poppi	Poppi	Palazzetto dello sport "Renato Bindi"	M	563 750.00					1					→
26	PUB_26	PUB	MS	Provincia di Massa e Carrara	Fosdinovo	Caserma carabinieri loc. Fosdinovo	A	325 142.00					1					→
27	PUB_27	PUB	PO	Comune di Cantagallo	Cantagallo	Palazzo comunale "La Torricella" loc. Luicciana	M	218 907.09					1					→



c.4) Verifiche su Edifici Pubblici Strategici e Rilevanti

N.	ID	Fonte finanziamento	Prov.	Ente beneficiario	Comune	Denominazione edificio	Tipo intervento	Importo assegnato	Importo impegnato	Avvio lavori/attività	Importo liquidato (accounto)	Importo liquidato (saldo)	SdA nov2017	1	2	3	4	trend
1	58_VR_1	58_VR	PI	Comune di Orciano P.	Orciano Pisano	Scuola materna comunale	VS	7.014,00	7.014,00	si	3.507,00	3.507,00	4					↑
2	58_VR_2	58_VR	MS	Comune di Carrara	Carrara	Scuola primaria "A. Saffi"	VS	16.000,00	16.000,00	si	8.000,00		3					↑
3	58_VR_3	58_VR	FI	Comune di Pontassie	Pontassieve	Palazzo Municipale	VS	16.000,00	16.000,00	si	8.000,00		3					↑
4	58_VR_4	58_VR	PI	Comune di Peccioli	Peccioli	Scuola primaria "Dante Alighieri"	VS	13.992,90	13.992,90	si	6.996,45		3					↑
5	58_VR_5	58_VR	GR	Provincia di Grosseto	Sorano	Istituto Linguistico "Zuccarelli"	VS	15.228,90	15.228,90	si	6.842,50		3					↑
6	58_VR_6	58_VR	MS	Comune di Fosdinovo	Fosdinovo	Scuola materna loc. Caniparola	VS	4.050,00	4.050,00	si	2.025,00		3					↑
7	58_VR_7	58_VR	AR	Comune di Montevarc	Montevarchi	Scuola elementare "F. Mochi" loc. Levanella	VS	6.540,00	6.540,00	si	1.798,50		3					↑
8	58_VR_8	58_VR	FI	Comune di Fiesole	Fiesole	Scuola primaria "Pazzino de' Pazzi" - Scuola secondaria "Mino da Fiesole" loc. Compiobbi	VS	16.000,00	16.000,00	si	16.757,00		3					↑
9	58_VR_9	58_VR	LU	Comune di Camaiole	Camaiole	Palazzo Comunale	VS	16.000,00	16.000,00	si	8.000,00		3					↑
10	58_VR_10	58_VR	AR	Comune di Arezzo	Arezzo	Scuola Materna ed Elementare loc. Quarata	VS	9.546,00	9.546,00	si	4.007,70		3					↑
11	58_VR_11	58_VR	AR	Comune di Civitella in	Civitella in Val di Chiana	Scuola Materna loc. Oliveto	VS	15.408,00	15.408,00	si	7.704,00	7.704,00	4					↑
12	58_VR_12	58_VR	SI	Comune di Casole d'E	Casole d'Elsa	Palazzo Comunale	VS	0,00	0,00		0,00		0					↓
13	58_VR_13	58_VR	FI	Comune di Fiesole	Fiesole	Scuola primaria "G. Guattierotti" loc. Girone	VS	11.544,00	11.544,00	si	*		3					↑
14	58_VR_14	58_VR	AR	Comune di Terranuov	Terranuova Bracciolini	Palazzo Comunale	VS	9.375,00	9.375,00	si	4687,5		3					↑
15	58_VR_15	58_VR	FI	Comune di Sesto Fior	Sesto Fiorentino	Palazzo Comunale	VS	16.000,00	16.000,00	si	8.000,00	8.000,00	4					↑
16	58_VR_16	58_VR	FI	Comune di Certaldo	Certaldo	Municipio	VS	13.545,00	13.545,00	si	6.772,50	6.772,50	4					↑
17	58_VR_17	58_VR	FI	Comune di Fiesole	Fiesole	Scuola infanzia "Jacopo Guattierotti" loc. Girone	VS	5.970,00	5.970,00	si	*		3					↑
18	58_VR_18	58_VR	AR	Comune di Castiglion	Castiglion Fibocchi	Palazzo Comunale	VS	4.500,00	4.500,00	si	2.250,00		3					↑
19	58_VR_19	58_VR	AR	Comune di Castellfran	Castellfranco Pian di Scò	Palazzo comunale loc. Pian di Scò	VS	7.347,00	7.347,00	si	3.673,50	3.673,50	4					↑
20	58_VR_20	58_VR	AR	Comune di Laterina	Laterina	Palazzo "Guinigi" - Palazzo Comunale	VS	6.270,00	6.270,00	si	3.135,00		3					↑
21	58_VR_21	58_VR	GR	Comune di Monteri	Monteri	Palazzo Comunale	VS	6.065,85	6.065,85	si	3.032,93		3					↑
22	58_VR_22	58_VR	MS	Comune di Massa	Massa	Scuola primaria "Battistini" loc. Mirteto	VS	16.000,00	16.000,00	si		16.000,00	4					↑
TOTALE REGIONE TOSCANA								232.396,65	232.396,65		100.502,08	38.884,50						
